



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.

TRIENIO 2023 - 2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA



EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, DISTRITO DE CUICATLÁN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS INTEGRANTES DEL CABILDO MUNICIPAL, REPRESENTADOS POR LA C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO Y EL C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, Y POR OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA, REPRESENTADOS POR EL C. FRANCISCO AMADOR SANTIAGO, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO.

UBICACIÓN

Table with 2 columns: Field (ESTADO, REGIÓN, DISTRITO, MUNICIPIO, LOCALIDAD) and Value (020 OAXACA, 01 SIERRA DE FLORES MAGÓN, 05 CUICATLÁN, 330 SAN PEDRO TEUTILA, 0002 SANTO DOMINGO DEL RIO)

DATOS GENERALES


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSPT/330/FAISMUN/20/06/24 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL 2835 M2, TERRACERIA: EXCAVACION PARA REVAJE DE CORONA EN TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.15 M. PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE 387.45 M3, ALBAÑILERIA: CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.40 M. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, CON REVENIMIENTOS DE 10 +/- 2.5 CM., ACABADO APARENTE 315 M, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, ACABADO RALLADO 2205 M2, BANQUETA DE 10 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, EN TABLEROS DE 0.80X2.50 M 252 M2, CUNETETA TIPO "V" DE 1 M X 0.20 M DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, ACABADO COMUN 315 M, COLECTOR PLUVIAL 1: EXCAVACIÓN DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO I, ZONA B 17.28 M3, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3, DE FY=4200 KG/CM2 0.09 TON, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4, DE FY=4200 KG/CM2 0.31 TON, CIMBRA ACABADO APARENTE EN MUROS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, SEPARADORES Y MOÑOS 43.84 M2, CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE F'c=200 KG/CM2 7.49 M3, COLECTOR PLUVIAL 2: EXCAVACIÓN DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO I, ZONA B 17.28 M3, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3, DE FY=4200 KG/CM2 0.09 TON, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4, DE FY=4200 KG/CM2 0.31 TON, CIMBRA ACABADO APARENTE EN MUROS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, SEPARADORES Y MOÑOS 43.84 M2, CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE F'c=200 KG/CM2 7.49 M3, ACABADOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETROREFLEJANTE 315 M, LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA 1 LOTE

Table with 2 columns: Field (INCIDENCIA, SUBCLASIFICACION, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, BENEFICIARIOS HOMBRES, TOTAL BENEFICIARIOS) and Value (COMPLEMENTARIA, PAVIMENTACIÓN, CONTRATO, 22 DE MAYO DE 2024, 22 DE MAYO DE 2024, 2205 M2, 634, 1092) and another set of fields (RUBRO, MODALIDAD, NO. DE CONTRATO, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO, FECHA DE TÉRMINO REAL, TIPO DE BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS MUJERES) with values (URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN, C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/20/06/202, 19 DE AGOSTO DE 2024, 19 DE AGOSTO DE 2024, PERSONAS, 668)

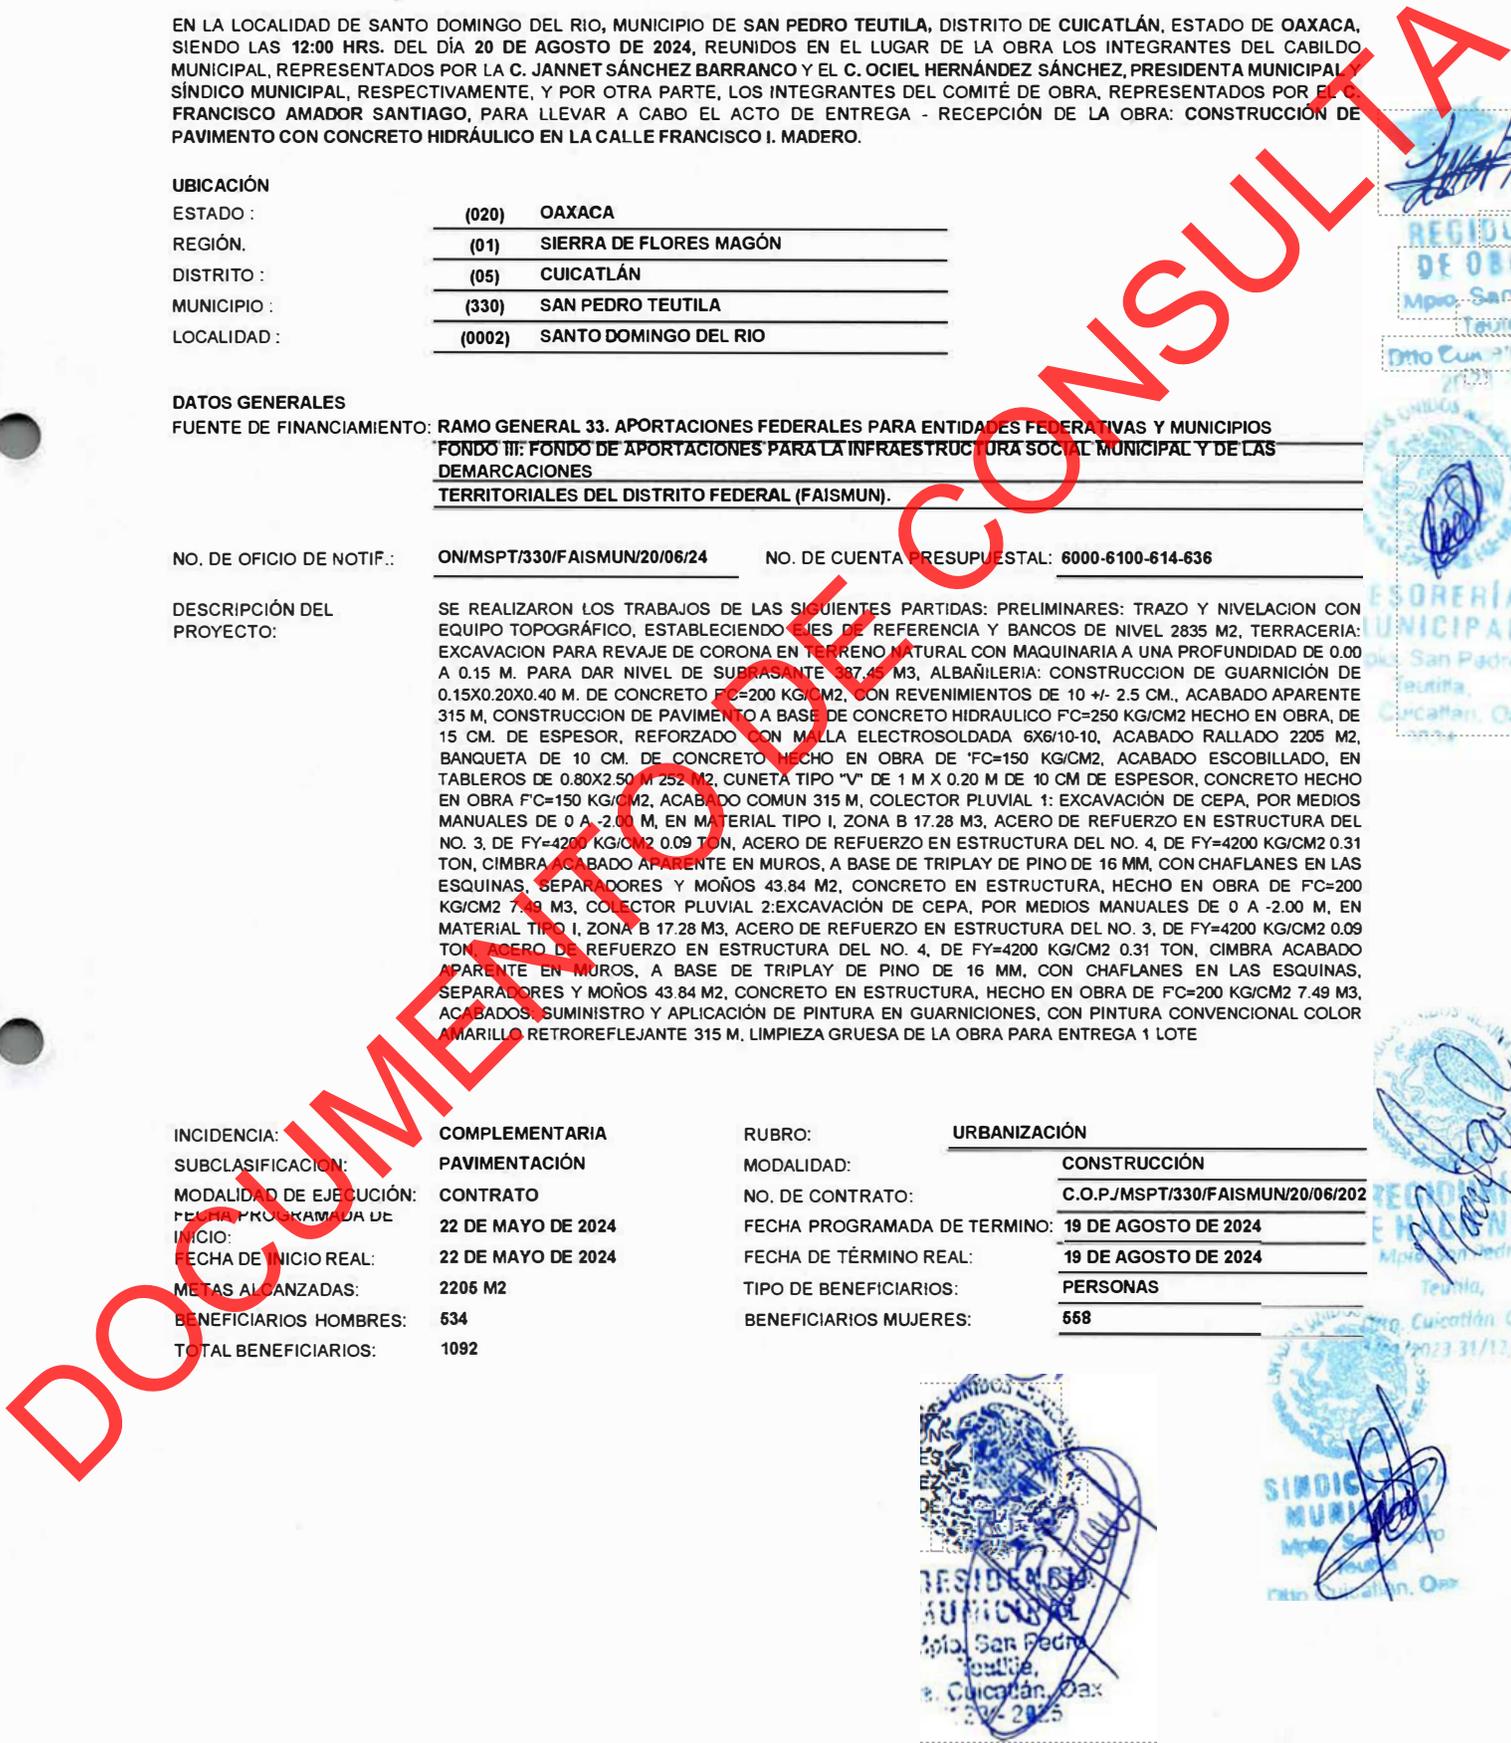



**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.**  
**TRIENIO 2023 - 2025**



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,848,655.92	\$1,800,787.47	\$1,800,787.47	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,848,655.92</b>	<b>\$1,800,787.47</b>	<b>\$1,800,787.47</b>	<b>\$0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRAZO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:  
 POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA

C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ REYES  
 REGIDOR DE HACIENDA

C. LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ  
 REGIDOR DE OBRAS

RECIBE LA OBRA:  
 POR EL COMITÉ DE LA OBRA

C. FRANCISCO AMADOR SANTIAGO  
 PRESIDENTE

C. BENITO CARRETERO  
 SECRETARIO

C. FLORENCIO MARCELINO MATEO  
 2do. VOCAL

C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
 SINDICA MUNICIPAL

C. SERGIO SÁNCHEZ ZARAUT  
 TESORERO MUNICIPAL

C. EUGENIO AMADOR PÉREZ  
 TESORERO

JOSE PEDRO ZARAGOZA  
 1er. VOCAL

SINDICATURA MUNICIPAL  
 Mpio. San Pedro Teutila  
 Dpto. Cuicatlán, Oax.  
 2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL  
 Mpio. San Pedro Teutila,  
 Dpto. Cuicatlán, Oax.  
 01/01/2024 - 31/12/2025

REGIDURÍA DE HACIENDA  
 Mpio. San Pedro Teutila,  
 Dpto. Cuicatlán, Oax.  
 27/03/2023 31/12/2025

DOCUMENTO DE CONSULTA
